

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Tecnológica de la Mixteca

Entidad federativa: Oaxaca
Clave Inst 811-2046100606



Procesación
Nombre: LCP Javier José Ruiz Santiago
Cargo: Vice Rector de Administración
Teléfono: 01 (953) 53 20214, 53 20399 ext. 103
Correo electrónico: javier@mixteco.utm.mx

Nombre: Arq. Itzamul Moya Solano
Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01 (953) 53 20214, 53 20399 ext. 770
Correo electrónico: imoya@mixteco.utm.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO


Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto

físicos, metros cuadrados										
y tipo de proyecto ¹		Español		cantidad		metros cuadrados				
3	X			Construcción de un Centro de Modelación Matemática	\$ 5,469,100.00	\$ 5,469,100.00	\$	Cubículos	19	278.67
								Sanitarios	2	29.92
								Modificación matemática	1	69.28
								Dirección	1	24.27
								Pasillos y escaleras	1	179.91
								Sala de juntas	1	69.28
								TOTAL	25	651.33
								Losas de Azotea	15	2427.90
								TOTAL	15	2427.90
								Salas de cómputo	6	568.56
4	X			Mantenimiento de edificios de la UTM	\$ 1,920,000.00	\$ 1,920,000.00	\$	Área para técnico	3	45.00
								Pasillos y escaleras	1	140.64
								Escaleras de emergencia	1	45.70
								TOTAL	11	799.90
								Área de purificación de agua	1	38.77
								Área de pasillos y dispensadores de agua	1	67.88
								TOTAL	2	106.65
								Aulas	5	491.04
								Sanitarios	2	54.41
								Pasillos y escalera	1	185.04
PN	X			Equipamiento para un módulo de 5 aulas	\$ 7,723,500.00	\$ 7,723,500.00	\$	TOTAL	8	731.49
								Mesas de 60x60cm	135	
								Mesas de 60x120cm	5	
								Sillas	140	
								TOTAL	280	0.00
								Mesas de 60x60cm	100	
								Mesas de 60x120cm	6	
								Sillas	106	
								TOTAL	212	0.00



MTA MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS
Nombre y firma del Titular de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se adjuntan anexos tanto fotos como videos.
2 En esta sección se indicará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, menos que se vean reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Trabaja en dos dígitos. dd, mm y aa.



ARQ. ITZAMUL MOYA SOLANO
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Período reportado
ENERO-MARZO_2023
FECHA DE CORTE: 31 DICIEMBRE 2022



Porcentaje de avance

100

Proyecto



3

Nombre de la obra

Construcción de un Centro de Modelación Matemática

REPORTES FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

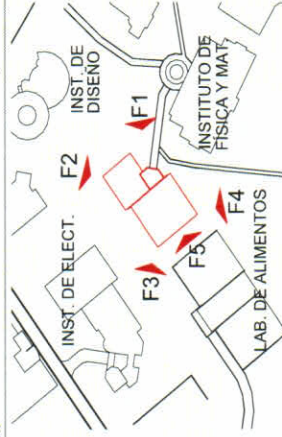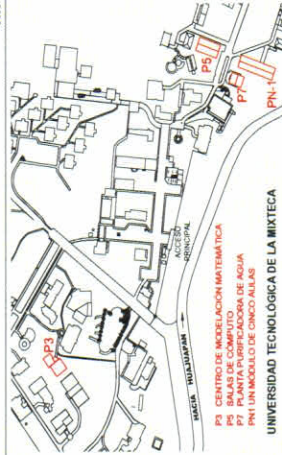

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

K.M. 2.5 CARRETERA HUAJUAPAN-ACATLIMA
SIN NÚMERO, HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:
Se han terminado todos los trabajos contratados de cimentación, estructura, albañilería e instalaciones



F1: VISTA 1 CONSTRUCCIÓN



F2: VISTA 2 CONSTRUCCIÓN



F3: VISTA 3 CONSTRUCCIÓN



F4: VISTA 4 CONSTRUCCIÓN



F5: VISTA 5 CONSTRUCCIÓN

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS

Nombre y firma del Titular de la IES

RECTORIA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra



ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Porcentaje de avance


100

[illegible]


Nombre de la obra:

Construcción de un edificio para salas de cómputo

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

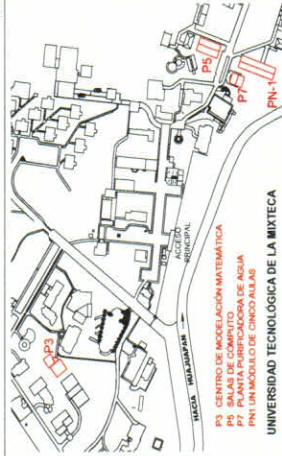

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

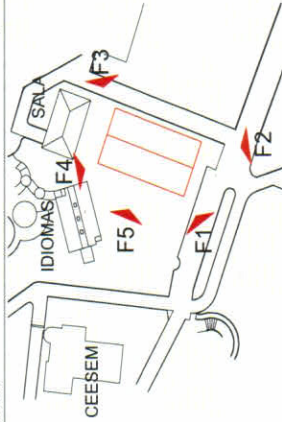

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

K.M. 2.5 CARRETERA HUAJUAPAN-ACATLIMA
SIN NÚMERO, HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA

50705



F4 - VISTA 1 EDIFICIO



F2: VISTA 2 EDIFICIO




F3: VISTA 3 EDIFICIO



F4: VISTA 4 EDIFICIO



FS: VISTA 5 EDIFICIO



MTRA MARIA DE I OS ANGELES PERALTA ARIAS





Nombre y firma del Titular de la IES:





FS: VISTA 5 EDIFICIO

ARO ITZAMATU II MOYA SOI AND

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

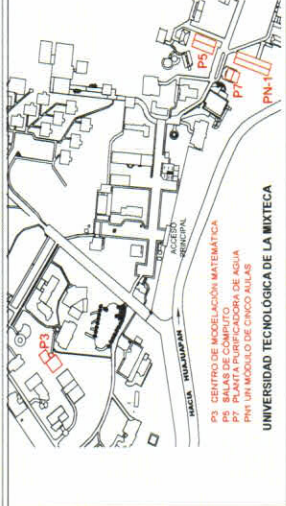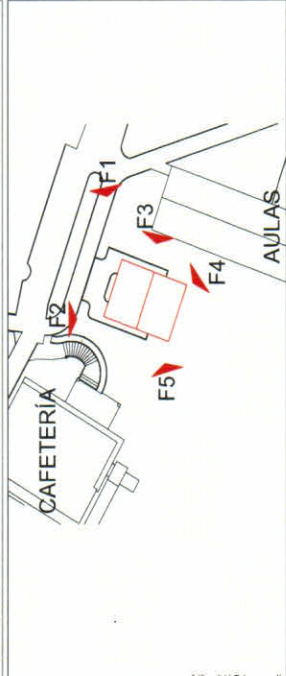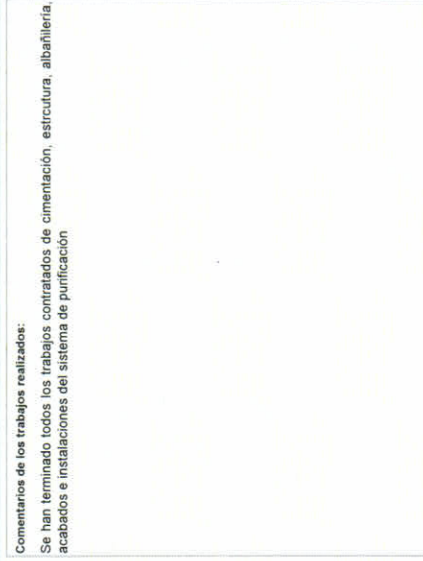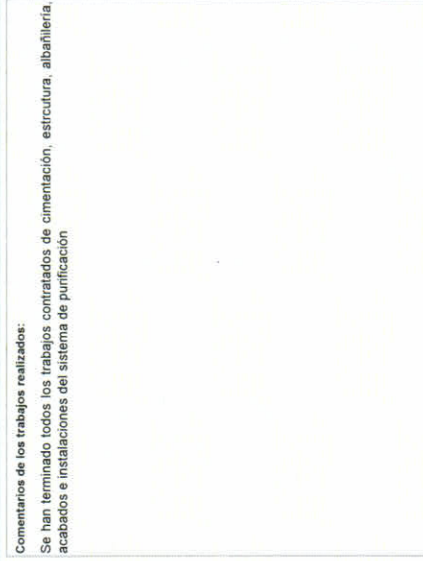2022	FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Periodo reportado ENERO-MARZO_2023 FECHA DE CORTE: 31 DICIEMBRE 2022
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA OAXACA	PROYECTO 7	Nombre de la obra Construcción de una planta purificadora de agua	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO K.M. 2.5 CARRETERA HUAJUAPÁN-ACATLIMA SIN NÚMERO, HUAJUAPÁN DE LEÓN, OAXACA
Porcentaje de avance 100	CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	 CAFETERÍA F1 F2 F3 F4 F5 AULAS	Comentarios de los trabajos realizados: Se han terminado todos los trabajos contratados de cimentación, estructura, albanilería, acabados e instalaciones del sistema de purificación
F1: VISTA 1 EDIFICIO 	F2: VISTA 2 EDIFICIO 	F3: VISTA 3 EDIFICIO 	F4: VISTA 4 EDIFICIO 
F5: VISTA 5 EDIFICIO 	F6: VISTA 6 EDIFICIO 	F7: VISTA 7 EDIFICIO 	F8: VISTA 8 EDIFICIO 
Nombre y firma del Titular de la IES MITRA, MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS	Nombre y firma del Titular de la IES ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO	Nombre y firma del Titular de la IES ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO	Nombre y firma del Titular de la IES ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO

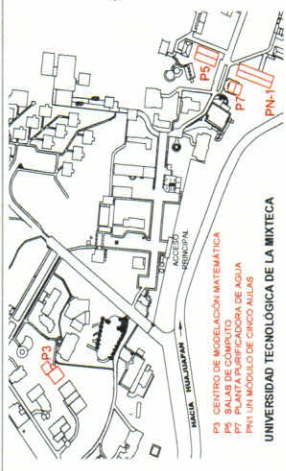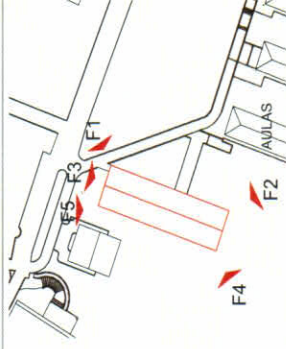2022 AÑO	FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Periodo reportado ENERO-MARZO_2023 FECHA DE CORTE: 31/03/2023		
	PN Nombre de la obra Construcción de dos módulos de 5 aulas	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO K.M. 2.5 CARRETERA HUAJUAPÁN-ACATLIMA SIN NÚMERO, HUAJUAPÁN DE LEÓN, OAXACA	
Porcentaje de avance 100	FOTOS				
		Comentarios de los trabajos realizados: Se han terminado todos los trabajos contratados de cimentación, estructura, albanilería, acabados, instalaciones y obra exterior			
F3: VISTA 3 TERRENO	F4: VISTA 4 TERRENO	F2: VISTA 2 TERRENO	F5: VISTA 5 TERRENO		
MITRA, MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS Nombre y firma del Titular de la IES 	ARQ. ITZAMATIL MOYA SOLANO Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES 				

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
