

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

	Nombre: Universidad Tecnológica de la Mixteca Entidad federativa: Oaxaca Clave 911: 20MSU0060R	Nombre: M.R.C. Mónica Edith García García Cargo: Representante Institucional Teléfono: 953 53 20214, 953 53 20399 ext. 780 y 785 Correo electrónico: representante@profes@mixteco.ultm.mx
RESPONSABLES		Nombre: Arq. Izamalud Moya Solano Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento Teléfono: 953 53 20214, 953 53 20399 ext. 770 Correo electrónico: imoya@mixteco.ultm.mx

[illegible]

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Tecnológica de la Mixteca

Entidad federativa: Oaxaca

Clave 911: 20MSU0060R

Nombre: M.R.C. Mónica Edith García García

Cargo: Representante Institucional

Teléfono: 953 53 20214, 953 53 20399 ext. 780 y 785

Correo electrónico: representante@tecnologica.mx

Nombre: Arq. Itzamatl Moya Solano

Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 953 53 20214, 953 53 20399 ext. 770

Correo electrónico: imoya@mixteco.utm.mx


Ciudad y Municipio: Oaxaca

Nombre: Arq. Itzamatl Moya Solano

Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 953 53 20214, 953 53 20399 ext. 770

Correo electrónico: imoya@mixteco.utm.mx



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO


ID de acuerdo con el SIFAM	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA										Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)				% de avance	Fechas Reales		Observaciones	Rendimiento a la TESOFE			Actas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Obras nuevas construidas	Obras de conservación	Mejoramiento	Mantenimiento	Proyecto sustentable	Monto autorizado (A)	No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B	Monto ejercido (D)	Remanente (E) =B-D	Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustentan el avance		Fechas Reales			Entrega-Recepción (Acta finalizado) MONTO	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Acta finalizado) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (Formulario DGE/SU) MONTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Inicio	Termino						Nombre del Equipo/equipo	Cantidad	Metros Cuadrados			Inicio	Termino								Linea de Captura	Fecha de pago	Importe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	Equipamiento de la carrera de Ingeniería Civil	X				\$ 2,307,589.00	LPIVCAEAS EOLUTIMX03 2023	22/12/23	04/03/24	\$ 2,307,589.00	SOTOMEX ENERGÍA S.A. DE CV	\$ 0.00	\$ 2,307,589.00	\$ 0.00	Máquina universal automática	1	-	Suministro de 1 máquina universal, 5 estaciones total topográfica y fotogrametría y robotizado	100.00%	22/12/23	04/03/24	Se han entregado los bienes, se adjunta Acta de Entrega-Recepción	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								No de factura: F. 28/12/23	28/12/23																				28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12/23	28/12

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
Nombre y firma de la Titular de la IES

ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas hojas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todos en dos dígitos, dd, mm y aa.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


1 PRIORIDAD	Nombre de la obra: Equipamiento Informático para Salas de Cómputo, Laboratorio de Multimedia y Centro de Modelación Matemática	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO
LABORATORIO DE MULTIMEDIOS LATITUD: 17.232837° LONGITUD: -77.805470° CENTRO DE MODELACIÓN LATITUD: 17.2327981° LONGITUD: -77.804848° SALAS DE CÓMPUTO LATITUD: 17.2327981° LONGITUD: -77.805541° 		
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA  COMPLEJOS DE EDIFICIOS PARA SALAS DE CÓMPUTO, LABORATORIO DE MULTIMEDIA Y CENTRO DE MODELACIÓN MATEMÁTICA 		
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS 		

FOTOS



Observaciones:

Suministro de 13 computadoras especializadas de 8gb, 2 computadoras especializadas de 16gb, 8 proyectores, 270 mesas para computadora, 200 computadoras de escritorio, 270 sillas para salas de cómputo, 3 equipos de cómputo de alto rendimiento y 5 sillas ejecutivas para el centro de modelación matemática

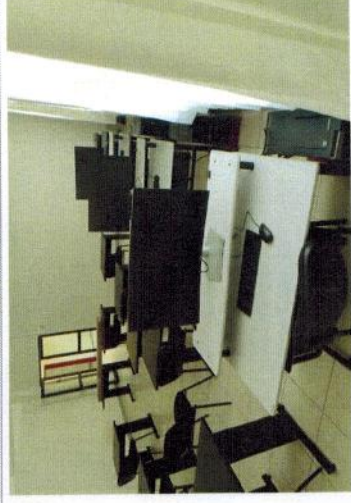

F3 EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO, CENTRO DE MODELACIÓN MATEMÁTICA

F4: EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO, CENTRO DE MODELACIÓN MATEMÁTICA

F5: EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO, CENTRO DE MODELACION MATEMATICA

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS

Nombre y firma de la Titular de la IES

ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

NOTA:

- Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



SALA DE COMPUTO 1
LATITUD: 17.826576°
LONGITUD: -97.802581°

SALA DE COMPUTO 2
LATITUD: 17.826735°
LONGITUD: -97.802101°

SALA DE COMPUTO 3
LATITUD: 17.826570°
LONGITUD: -97.801820°



100.00%

Porcentaje de avance


100.00%

FOTOS



Observaciones :

Suministro de 94 computadoras de escritorio, 2 proyectores y 1 impresora

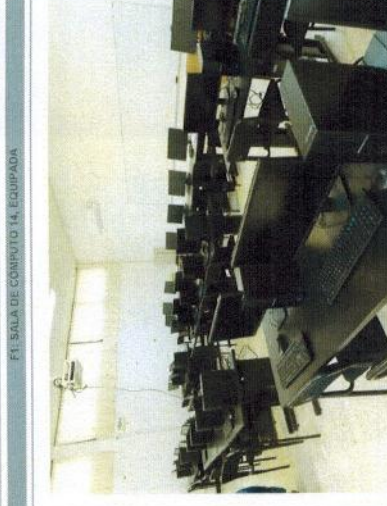

ST. GIL & DE CAMBUTO 14 FOLIO 10A



9. SALA DE COMPUTO 14 EQUIPADA



LA CAJA DE CÓNDUTO EN LABORATORIO DE ELECTRÓNICA: EQUIPADA

ET-SALA DE CÓMPUTO 1 EQUIPADA

CONTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS

Nombre y firma de la Titular de la IES

ARO: ITZAMATUL MOYA SOLANO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario. Debe enmarcarse, mantenerse y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIMERA	2	Nombre de la obra:	Terminación del Centro de Modelación Matemática	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	
SEGUNDA	3	Nombre de la obra:	Terminación del Centro de Modelación Matemática	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	
TERCERA	4	Nombre de la obra:	Terminación del Centro de Modelación Matemática	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	
CUARTA	5	Nombre de la obra:	Terminación del Centro de Modelación Matemática	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	
QUINTA	6	Nombre de la obra:	Terminación del Centro de Modelación Matemática	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	
SEXTA	7	Nombre de la obra:	Terminación del Centro de Modelación Matemática	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	
SEPTIMA	8	Nombre de la obra:	Terminación del Centro de Modelación Matemática	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	
OCATA	9	Nombre de la obra:	Terminación del Centro de Modelación Matemática	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	
NOVENA	10	Nombre de la obra:	Terminación del Centro de Modelación Matemática	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	
DIEZ	11	Nombre de la obra:	Terminación del Centro de Modelación Matemática	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	

FOTOS




E4-VISTA-18111210



63. VASYA 7 FISHCHIKO



EX-VISTA 3 EDIFICIO

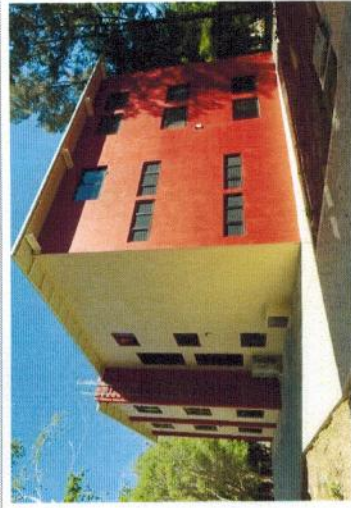

VA: VISTA 4 EDIFICIO



F5: VISTA 5 EDIFICIO

Observaciones :

Se han terminado los trabajos contratados al 100%

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS

Nombre y firma de la Titular de la IES

ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para empalme, mantenimiento y adscripciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo u lugar para el antes, durante y después de la obra.

PROPIEDAD

3

Nombre de la obra:

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




Equipamiento de la carrera de Ingeniería Civil

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

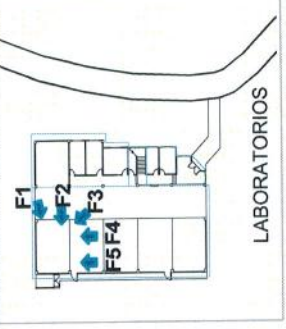


LABORATORIO DE INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ

LATITUD: 17.311396°

LONGITUD: -87.503641°

LABORATORIOS

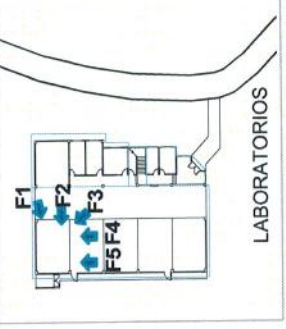

Porcentaje de avance

100.00%

Observaciones:

Suministro de 1 máquina universal, 5 estaciones total topográfica y 1 rotomartillo


F1: ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA



F2: ESTACIONES TOTALES TOPOGRAFICAS




F3: ESTACIONES TOTALES TOPOGRAFICAS



F4: ESTACIONES TOTALES TOPOGRAFICAS Y MAQUINA UNIVERSAL



F5: MAQUINA UNIVERSAL

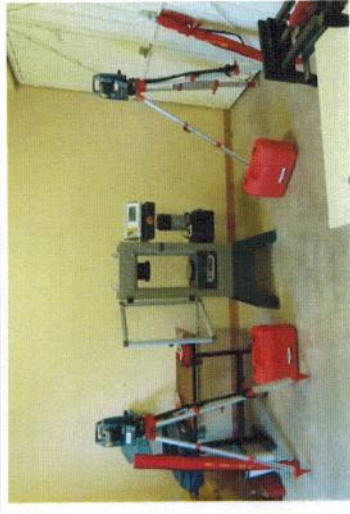

F6: MAQUINA UNIVERSAL



MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS

Nombre y firma de la Titular de la IES

ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestilla, se podrán copiar tantas pestillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Porcentaje de avance

100.00%

4

Nombre de la obra:

Equipamiento del Laboratorio de Mecatrónica en el área Mecánica


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

**UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON
FOTOS REFERENCIADAS**



INSTITUTO DE ELECTRONICA
Y MECATRONICA
LATITUD: 17.828130°
LONGITUD: -97.805668°

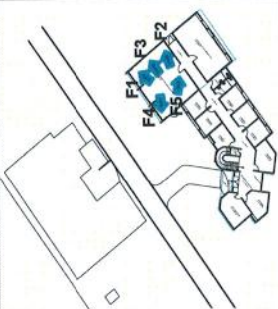

FOTOS



Observaciones :

Suministro de un sistema de entrenamiento en automatización y control industrial, un sistema modular de Entrenamiento en Neumática Básica y todos los sistemas de Entrenamiento Básico en Hidráulica



14. SISTEMA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL



62- SISTEMA DE ENTRENAMIENTO BÁSICO EN HIDRÁULICA



3.2. SISTEMA DE ENTRENAMIENTO BÁSICO EN HIDRÁULICA

EL SISTEMA MODULAR DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA BÁSICA

5.5. SISTEMA MODULAR DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA BÁSICA.

CONTR. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS

Nombre y firma de la Titular de la LES

ABO ITZAMATIH MOYA SOLANO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MATECA
LATITUD: 12.827348°
LONGITUD: -87.864551°

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

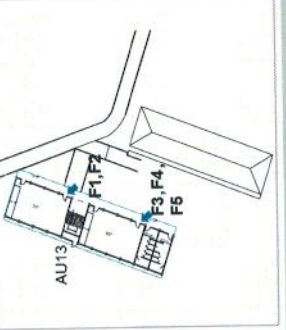


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MATECA
COMPLEJO DE SALONES DE CLASE CON EQUIPO AUDIOVISUAL DE PROYECCIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

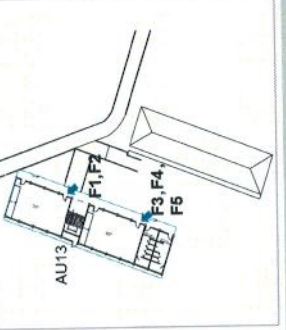


Porcentaje de avance

100.00%

Observaciones:

Suministro de 11 videoproyectores para salones de clases


F1: AULA CON PROYECTOR




F2: AULA CON PROYECTOR




F3: AULA CON PROYECTOR




F4: AULA CON PROYECTOR

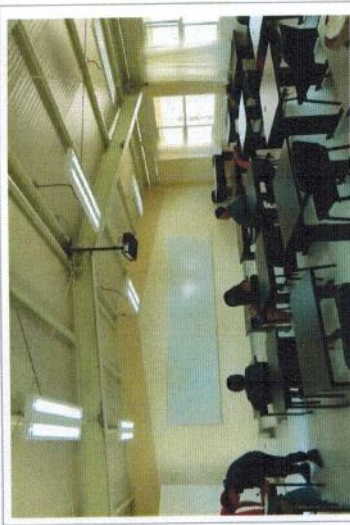

F5: AULA CON PROYECTOR

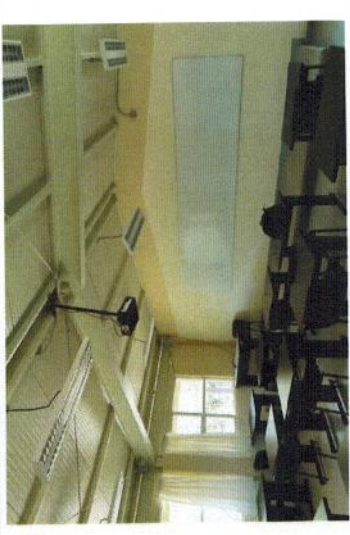

F6: AULA CON PROYECTOR

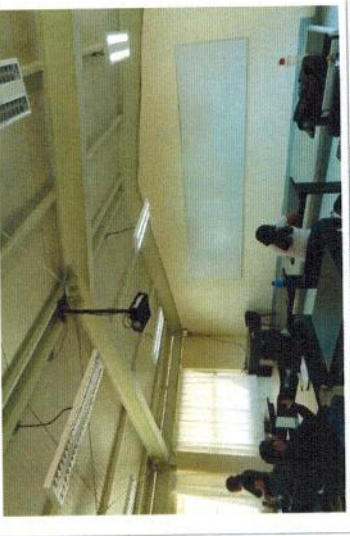

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS

Nombre y firma de la Titular de la IES


ARQ. ITZAMATUL NOYA SOLANO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

NOTA:

- Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

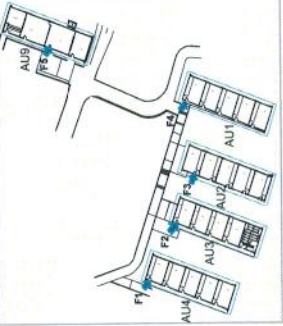PROYECTO 5	Nombre de la obra: Equipamiento de salones de clases con equipo audiovisual y de proyección
GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO	
	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MISTECA LATITUD: 17.827348° LONGITUD: -91.394301°	
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	
	

Porcentaje de avance

100.00%

FOTOS

		
F1: AULA CON PROYECTOR	F2: AULA CON PROYECTOR	F3: AULA CON PROYECTOR
Observaciones: Suministro de 11 videoproyectores para salones de clases		

F3: AULA CON PROYECTOR

F2: AULA CON PROYECTOR

F1: AULA CON PROYECTOR

MTA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS
Nombre y firma de la Titular de la IES


ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todos los sitios. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma zona, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
