

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Tecnológica de la Mixteca

Entidad federativa Oaxaca

Clave 911: 20MSU0060R

Nombre: M.R.C. Mónica Edith García García

Cargo: Representante Institucional

Teléfono: 953 53 20214, 953 53 20399 ext. 780 y 785

Correo electrónico: representanteopds@fisc@mixteco.utm.mx

Nombre: Arq. Itzamatl Moyá Solano

Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 953 53 20214, 953 53 20399 ext. 770

Correo electrónico: imoya@mixteco.utm.mx
diproyectosconstruccion@mixteco.utm.mx

Obras y Mantenimiento

Paraleción

RESPONSABLES

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	ID de acuerdo con el SIFAM	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				Remanente (E) =B-D	Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)				Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales		Observaciones	Remanero a la TESOFE				Actas	
			Obras de construcción	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento		Proyecto sustentable	No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas	Monto Contratado (B)		Contratista	Monto no Contratado(C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B	Nombre del Espacio/equipo	Cantidad			Metros Cuadrados	Inicio		Termino	Fecha de pago	Importe	Entrega- Recepción (Acta finiquito) MONTO	Fecha	Acta Administrat Entrega- Recepción (formato DGESU) MONTO
1	1	CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA CIVIL	x				\$ 9,000,000.00	-	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,000,000.00	Vestibulo de acceso	1.00	37.81	GLOBAL DEL PROYECTO	0.00%			Se realizará la gestión para obtener el oficio de autorización de recursos ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca y así poder llevar a cabo el proceso de licitación pública.	-						
													Pasillos	2.00	79.80												
													Cubículos	4.00	46.62												
													Escaleras	1.00	30.00												
													Almacén	1.00	27.34												
													Sala de juntas	1.00	31.37												
													Sanitarios	2.00	39.22												
													lockers	1.00	5.97												
													Laboratorios	4.00	421.04												
													Aulas	4.00	195.08												
		TOTAL	21	914.25																							
2	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PRIMERA ETAPA (TECHUMBRE DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA.	x				\$ 7,402,006.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,402,006.00	Techumbre de la cancha de futbol rápido	1.00	1610.66	GLOBAL DEL PROYECTO			Se realizará la gestión para obtener el oficio de autorización de recursos ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca y así poder llevar a cabo el proceso de licitación pública.	-								
														TOTAL												1	1610.66

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
Nombre y firma de la Titular de la IES

ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podran anexar tanta fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

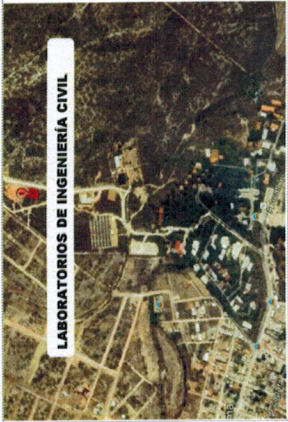
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

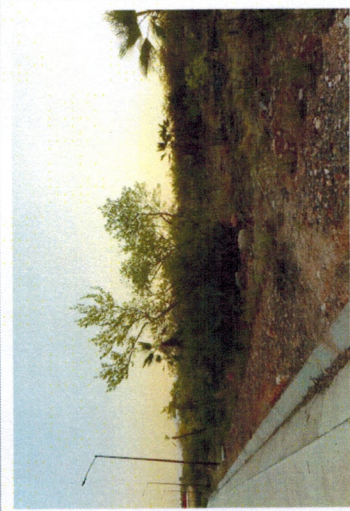
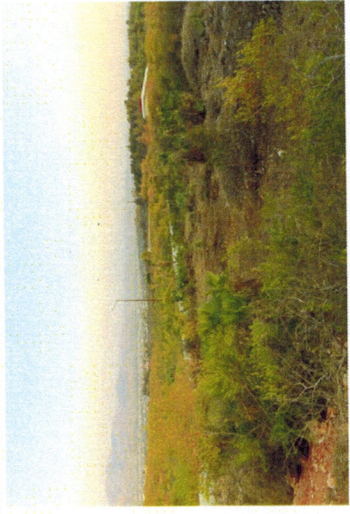
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta.
ENERO-MARZO_2024

Fecha de elaboración: 05/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

1	Nombre de la obra	CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL.	
GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	
			
			
Porcentaje de avance		0.00%	

FOTOS	
	
	
	
Observaciones:	

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES	
ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO	

Nombre y firma de la Titular de la IES	
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS	

NOTA
Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO 2 Nombre de la obra

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PRIMERA ETAPA (TECHUMBRE DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

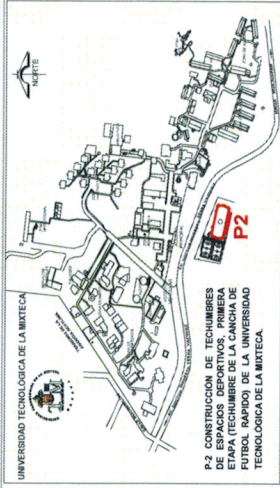


Porcentaje de avance

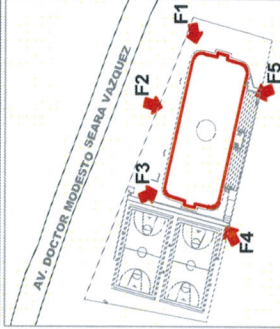
0.00%



TECHUMBRE DE LA CANCHA DE
FUTBOL RÁPIDO
LATITUD: 17.827981°
LONGITUD: -97.807486°



P2 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES
DE ESPACIOS DEPORTIVOS PRIMERA
ETAPA (TECHUMBRE DE LA CANCHA DE
FUTBOL RÁPIDO) DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA



FOTOS



F1: VISTA 1 CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO



F2: VISTA 2 CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO



F3: VISTA 3 CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO



F4: VISTA 4 CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO



F5: VISTA 5 CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO

Observaciones :

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS

Nombre y firma de la Titular de la IES

ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

NOTA

* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
