

Nombre:

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Entidad federativa:

Oaxaca

Clave 911:

20MSU0060R

Nombre:

M. R. C. Mónica Edith García García

Cargo:

Representante Institucional

Teléfono:

953 53 20214, 953 53 20399 ext. 780 y 785

Correo electrónico:

representante@odysseia@mixteco.utm.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO																												
Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					Monto ejercido (D)	Remanente (E) = (B-D)	Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)				Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales		Observaciones	Retiro a la TESOFE		Actas			
		Otros de conformidad	Equipamiento	Rehabilitación y mejoras	Mantenimiento		Proyecto sustentable	No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas	Monto Contratado (B)	Contratista			Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado (C=A-B)	Nombre del Espacio/Equipo	Cantidad	Metros Cuadrados			Inicio	Término		Línea de Captura	Importe	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (Formato DGESU/II)	MONTO	
1	CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA CIVIL	x					UTM-EO-920005999-E1-2024	21/06/24	07/12/24	\$ 9,000,000.00	\$ 0.00	\$ 9,000,000.00	\$ 0.00		Vestibulo de acceso	1.00	37.81	Se han terminado los trabajos contratados al 100%	100.00	21/06/24	13/03/25	El retiro realizado a la TESOFE es el monto penalizado a la contratista por retraso en la entrega de los trabajos contratados	0025AAS23 910717754 02/04/25 65	\$178,814.00	SI	27/03/25	SI	27/03/25
															Pasillos	2.00	79.80											
2	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PRIMERA ETAPA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	x					UTM-EO-920005999-E2-2024	12/07/24	08/12/24	\$ 7,402,006.00	\$ 0.00	\$ 7,402,006.00	\$ 0.00		Techumbre de la cancha de futbol rapido	1.00	1610.66	Se han terminado los trabajos contratados al 100%	100.00	12/07/24	04/01/25				SI	27/01/25	SI	27/01/25
															TOTAL	1	1610.66											
3	CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA CIVIL (AMPLIACIÓN DE METAS)	x					UTM-AD-920005999-E3-2024	30/12/24	07/02/25	\$ 355,469.27	\$ 0.00	\$ 355,469.27	\$ 0.00		Terminación de acabados del edificio	1.00	57.52	Se han terminado los trabajos contratados al 100%	100.00	16/01/25	24/02/25				SI	27/02/25	SI	27/02/25
															TOTAL	1	57.52											
												\$16,757,475.27			\$0.00	\$16,757,475.27	\$0.00											

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS

Nombre y firma de la Titular de la IES

ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos dd, mm y aa.

2024

BARRIDO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

ENERO-MARZO_2025

Fecha de elaboración: 02/04/2025

PROYECTO


1

Nombre de la obra:

CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL

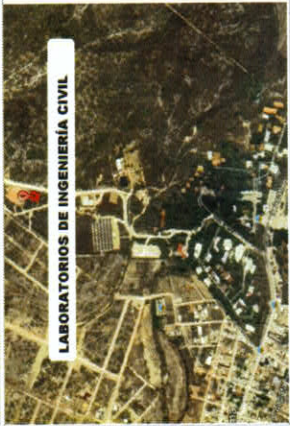

LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL


LATITUD: 17.832897°

LONGITUD: -97.803397°

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

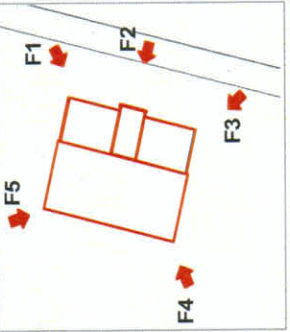

Porcentaje de avance

100.00%

FOTOS

F1: VISTA 1 AVANCE DE PLANTA BAJA Y ALTA DEL EDIFICIO



F2: VISTA 2 AVANCE DE PLANTA BAJA Y ALTA DEL EDIFICIO



F3: VISTA 3 AVANCE DE PLANTA BAJA Y ALTA DEL EDIFICIO



F4: VISTA 4 AVANCE DE PLANTA BAJA Y ALTA DEL EDIFICIO



F5: VISTA 5 AVANCE DE PLANTA BAJA Y ALTA DEL EDIFICIO



Observaciones:

Se han terminado los trabajos contratados al 100%

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS

Nombre y firma de la Titular de la IES

ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2

Nombre de la obra:

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PRIMERA ETAPA (TECHUMBRE DE LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA.

PROYECTO

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

P-2 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PRIMERA ETAPA (TECHUMBRE DE LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA.

PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

P-2 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PRIMERA ETAPA (TECHUMBRE DE LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA.

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

100.00%

Porcentaje de avance

FOTOS

F1: VISTA 1 ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE DE CANCHA

F2: VISTA 2 BANICAS DE JUGADORES Y ÁRBITROS

F3: ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE DE CANCHA

F4: VISTA 4 ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE DE CANCHA

F5: VISTA 5 ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE DE CANCHA Y TECHUMBRE DE GRADAS

Observaciones:

Se han terminado los trabajos contratados al 100%

Nombre y firma del Titular de Obra y Mantenimiento de la IES

ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporto fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestalla, se podrán copiar tantas pestallas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
ENERO-MARZO, 2025
Fecha de elaboración: 02/04/2025

3

Nombre de la obra:

CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL (AMPLIACIÓN DE METAS)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL (AMPLIACIÓN DE METAS)



CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL (AMPLIACIÓN DE METAS)

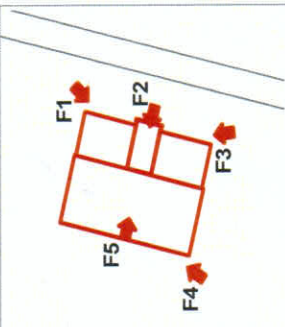

100.00%


Porcentaje de avance

FOTOS


F1: PASILLOS EXTERIORES Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN EXTERIOR



F2: ELABORACIÓN DE CHAPLÁN E IMPERMEABILIZACIÓN

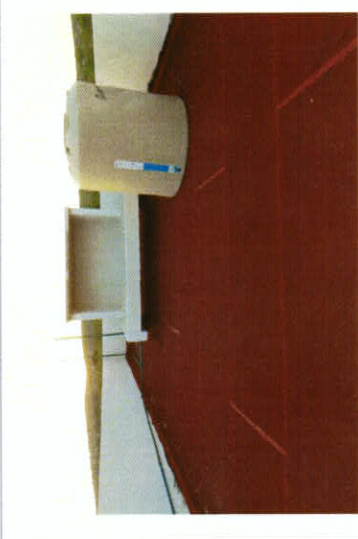

F3: PASILLOS EXTERIORES Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN EXTERIOR

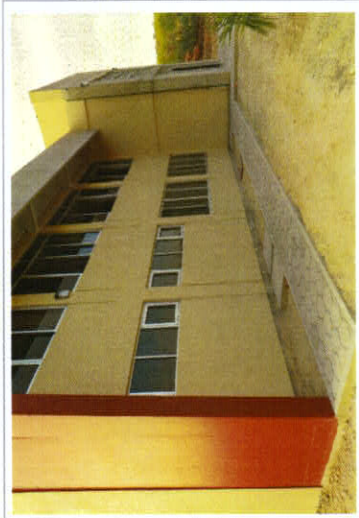

F4: PASILLOS EXTERIORES



F5: APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN INTERIOR



Observaciones:

Se han terminado los trabajos contratados al 100%

Nombre y firma de la Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
