

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO																			OBRA CONCLUIDA												
Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto		Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					Monto ejercido (D)	Remanente (E)=B-D	Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustentan el avance	Fechas Reales		Reintegro a la TESOFE		Actas											
		Oficina nueva (construcción)	Oficina de mantenimiento		Reparación y mejoras	Equipamiento	No. (si del Contrato) (h)	FECHAS PROGRAMADAS	Monto Contratado (B)			Contratista	Monto (C)=B-A	Nombre del Espacio/equipamiento		Capacidad	Metros Cuadrados	Inicio	Termino	Observaciones	Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Mes/año final/initial)	Fecha de Acta de Recepción (Mes/año final/initial)	MONTO	MONTO				
																			% de avance												
																			GLOBAL DEL PROYECTO												
1	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINARIA (LIFEI) PARA PROGRAMAS STEM	X		\$ 6,433,611.73			\$0.00		\$0.00	\$6,433,611.73	Circulación	1.00	108.97			Por necesidades propias de la Universidad, se realizará la solicitud de rectificación y alcance de las muelas de los proyectos beneficiados	-														
											Bodega	1.00	251																		
											Oficina técnica	1.00	10.99																		
											Almacén general	1.00	10.81																		
											Sanitarios	2.00	49.60																		
											Laboratorios	3.00	407.23																		
											TOTAL	9	691.11																		
2	MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE LABORATORIO DE MOBLARIO DE LOS LABORATORIOS PARA PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	X		\$ 3,306,092.94			\$0.00		\$0.00	\$ 3,306,092.94	Videoproector	14.00	-			Por necesidades propias de la Universidad, se realizará la solicitud de rectificación y alcance de las muelas de los proyectos beneficiados	-														
											Computadora de escritorio	85.00	-																		
											Switch TP-Link	2.00	-																		
											Equipo de cómputo de alto rendimiento	1.00	-																		
											Sillas	15.00	-																		
											Aire acondicionado de 4.5 TR	1.00	-																		
											TOTAL	118	0.00																		
3	EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO DE FÍSICO-QUÍMICO, DE LOS LABORATORIOS PARA PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	X		\$ 1,834,759.18			\$0.00		\$0.00	\$ 1,834,759.18	Ósciloscopio Digital tipo	21.00	-			Por necesidades propias de la Universidad, se realizará la solicitud de rectificación y alcance de las muelas de los proyectos beneficiados	-														
											Generador de funciones	17.00	-																		
											Fuente de voltaje	17.00	-																		
											Cámpara de extracción	1.00	-																		
											Placa de aplicación	2.00	-																		
											Balanza analítica	2.00	-																		
											Calorímetro	1.00	-																		
											Mesa para balanza	2.00	-																		
											Rouler CNC	1.00	-																		
											Multímetro digital	12.00	-																		
											Máquina CNC	1.00	-																		
											Impresora 3D	2.00	-																		
											TOTAL	79	0.00																		
4	AMPLIACIÓN DE TALLERES DE DISEÑO Y DEL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE MANUFACTURA	X		\$ 786,802.41			\$0.00		\$0.00	\$ 786,802.41	CERÁMICA					Por necesidades propias de la Universidad, se realizará la solicitud de rectificación y alcance de las muelas de los proyectos beneficiados	-														
											Área de secado	1.00	44.82																		
											Área de bodega	1.00	9.76																		
											Área de transformación	1.00	33.93																		
											Área de vitrolución	1.00	30.90																		
											MANUFACTURA																				
											Sanitarios y vestidores	2.00	31.02																		
											Circulación	1.00	13.46																		
											Área de trabajo	1.00	87.81																		
											TOTAL	8	251.70																		

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Tecnológica de la Mixteca	
Entidad federativa: Oaxaca	
Clave 911: 20MSU0060R	
Nombre: M.R.G. Mónica Edith García García	
Cargo: Representante Institucional	
Teléfono: 953 53 20214, 953 53 20399 ext. 780 y 785	
Correo electrónico: representante@odgpyfca@mixteco.utm.mx	
Nombre: Arq. Itzamatul Moya Solano	
Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento	
Teléfono: 953 53 20214, 953 53 20399 ext. 770	
Correo electrónico: imoya@mixteco.utm.mx	

RESPONSABLES

Planificación

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	ID de acuerdo con el SIFRAM	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					Monto ejercido (D)	Remanente (E) = B-D	Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustentan el avance	Fechas Reales		Observaciones	Reintegración a la TESOFE			Actas											
			Obra nueva construcción	Obra de conservación	Equipamiento		Adquisición y mejoras	Rehabilitación	Proyecto sustentable	No. (S) de Contrato (S)	Fechas Programadas			Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado (C)		Diferencia entre Autorizado y Contratado (C=A-B)	Nombre del Espacio/equipamiento		Cantidad	Metros Cuadrados	% de avance	Inicio	Termino	Linea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Acta de Entrega-Recepción)	Fecha	Acta de Entrega-Recepción (formato DGE/SUJ)	MONTO			
5		CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS SEGUNDA ETAPA LAS CANCHAS DE BASQUETBOLO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	X		\$ 1,676,847.80	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 1,676,847.80	Techumbre	2.00	1638.80			0.00		GLOBAL DEL PROYECTO				Por necesidades de la Universidad, se realizara la solicitud de modificación y aumento de las metas de los proyectos beneficiados												
																											Gradas	4.00	231.52						
																														Veredones	4.00	78.01			
																																	Caseta de Inversiones	1.00	12.50
TOTAL		2	2146.83																																
											TOTAL		\$14,039,114.06		\$0.00		\$0.00		\$14,039,114.06																

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS
Nombre y firma de la Titular de la IES

ARO. ITZAMATUL MOYA SOLANO
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL					
PROYECTO		CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS			
GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO			
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM LATITUD: 17.833346° LONGITUD: -97.053595°	P1 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM				
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) PARA PROGRAMAS STEM	F1: VISTA 1 TERRENO				
F2: VISTA 2 TERRENO	F3: VISTA 3 TERRENO				
F4: VISTA 4 TERRENO	F5: VISTA 5 TERRENO				
Observaciones:					
Porcentaje de avance 0.00%					
Nombre y firma del Titular de las Obras y Mantenimiento de la IES MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS					
Nombre y firma del Titular de las Obras y Mantenimiento de la IES ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO					

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

PROYECTO	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS																														
MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO DE LOS LABORATORIOS Nombre de la obra: 2 Georeferencia o Croquis de Localización de la Obra o Proyecto	MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO DE LOS LABORATORIOS PARA PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA LATITUD: 16° 41' 30" N LONGITUD: 97° 28' 42" W 	 RELACION DE EDIFICIOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <td>15</td> <td>LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</td> </tr> </table> P-2 MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO COMPUTACIONAL PARA LOS LABORATORIOS PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	15	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	13	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	7	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
15	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																															
14	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																															
13	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																															
12	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																															
11	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																															
10	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																															
9	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																															
8	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																															
7	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																															
6	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																															
5	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																															
4	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																															
3	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																															
2	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																															
1	LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																															

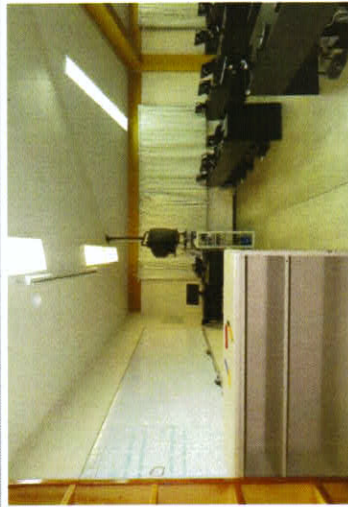
FOTOS



F1: VISTA 1 LABORATORIO



F2: VISTA 2 LABORATORIO



F3: VISTA 3 LABORATORIO



F4: VISTA 4 LABORATORIO



F5: VISTA 5 LABORATORIO

Observaciones:

ARQ. ITZAMPATUL MOYA SOLANO

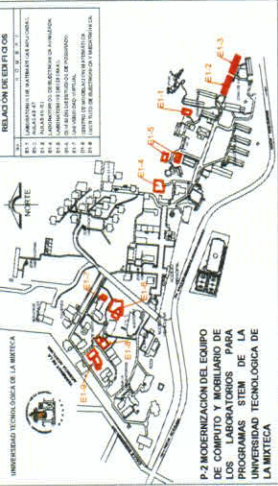

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
Nombre y firma de la Titular de la IES

NOTA:

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para enjuiciamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

		MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO DE LOS LABORATORIOS PARA PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	
PROYECTO 2	Nombre de la obra MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO DE LOS LABORATORIOS PARA PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO DE LOS LABORATORIOS PARA PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO DE LOS LABORATORIOS PARA PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA LONGITUD: 97.804387*	
GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	
			
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS			

Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS



F1: VISTA 1 LABORATORIO



F2: VISTA 2 LABORATORIO



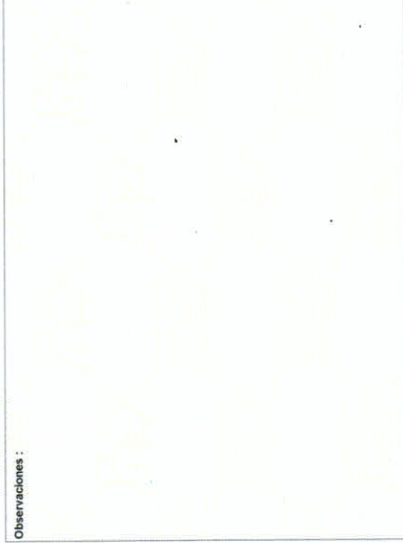
F3: VISTA 3 LABORATORIO



F4: VISTA 4 LABORATORIO



F5: VISTA 5 LABORATORIO



Observaciones:

MTRA. MARIA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS

Nombre y firma de la Titular de la IES

ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

NOTA:

* Es muy importante que se anexe un reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestilla, se podrán copiar tantas pestillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

SERVICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

ENERO-MARZO_2025

Fecha de elaboración: 02/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

	Proyecto 3 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y FÍSICO-QUÍMICO, DE LOS LABORATORIOS PARA PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	Ubicación de la obra o proyecto con fotos referenciadas
Georeferencia o croquis de localización de la obra o proyecto	Croquis referenciado en planta de conjunto de la obra o proyecto	Ubicación de la obra o proyecto con fotos referenciadas

FOTOS

F1: VISTA 1 LABORATORIO	F2: VISTA 2 LABORATORIO	F3: VISTA 3 LABORATORIO	F4: VISTA 4 LABORATORIO	F5: VISTA 5 LABORATORIO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO
--

Nombre y firma de la Titular de la IES MYRA, MARIA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS

NOTA:
Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

SERVICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

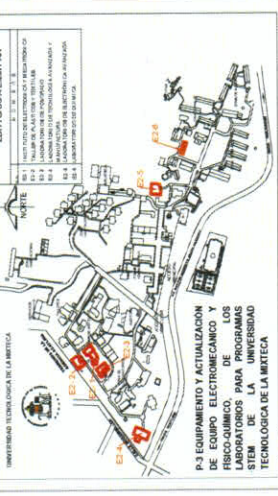

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

ENERO-MARZO_2025

Fecha de elaboración: 02/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

3 Nombre de la obra		EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y FÍSICO-QUÍMICO, DE LOS LABORATORIOS PARA PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	
GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	
			
EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y FÍSICO-QUÍMICO, DE LOS LABORATORIOS PARA PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA		P-3 EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y FÍSICO-QUÍMICO, DE LOS LABORATORIOS PARA PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LA OBRA O PROYECTO LATITUD: 17.32'N LONGITUD: 97.84'W		COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LA OBRA O PROYECTO LATITUD: 17.32'N LONGITUD: 97.84'W	
			
Porcentaje de avance		0.00%	

FOTOS



F1: VISTA 1 LABORATORIO



F2: VISTA 2 LABORATORIO



F3: VISTA 3 LABORATORIO



F4: VISTA 4 LABORATORIO



F5: VISTA 5 LABORATORIO

Observaciones:

MTRA. MARIA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
Nombre y firma de la Titular de la IES

ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrá copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma antes, durante y después de la obra.

Fotografía 4	Nombre de la obra AMPLIACIÓN DE TALLERES DE DISEÑO Y DEL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA AVANZADA DE MANUFACTURA	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO
		
AMPLIACIÓN DE TALLERES DE DISEÑO Y DEL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA AVANZADA DE MANUFACTURA CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CONCORDIA: 97 8942388		

FOTOS



Observaciones :



EL VISTA 1 EDIFICIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CONTRATADOS

Fig. 4. VISTA 4 EDIFICIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CONTRATADOS

ES: VISTA 5 EDIFICIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CONTRATADOS

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS

Nombre y firma de la Titular de la IES

ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario.

2025

SUBDIRECCIÓN FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
ENERO-MARZO_2025

Fecha de elaboración: 02/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

5 Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE ESPACIOS DEPORTIVOS, SEGUNDA ETAPA (TECHUMBRE DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	
GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	
Porcentaje de avance 0.00%		Observaciones:	
F1: VISTA 1 CANCHAS DE BASQUETBOL		F2: VISTA 2 CANCHAS DE BASQUETBOL	
F3: VISTA 3 CANCHAS DE BASQUETBOL		F4: VISTA 4 CANCHAS DE BASQUETBOL	
MTA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS Nombre y firma de la Titular de la IES		ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES	

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
