

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Tecnológica de la Mixteca  
Entidad federativa: Oaxaca  
Clave 911: 20MSU0060R

Nombre: Mirra Alma Yadira Salazar Govea  
Cargo: Representante Institucional  
Teléfono: 953 53 20214, 953 53 20399 ext 780 y 785  
Correo electrónico: [representanteinstitucional@mixteca.utm.mx](mailto:representanteinstitucional@mixteca.utm.mx)

Nombre: Arq. Itzamnatul Moyá Solano  
Cargo: Jefe del Departamento de Proyecto, Construcción y Mantenimiento  
Teléfono: 953 53 20214, 953 53 20399 ext. 770  
Correo electrónico: [itzyam@mixteca.utm.mx](mailto:itzyam@mixteca.utm.mx)

Nombre: MTRA. ALMA YADIRA SALAZAR GOVEA  
Cargo: Representante Institucional  
Teléfono: 953 53 20214, 953 53 20399 ext 780 y 785  
Correo electrónico: [representanteinstitucional@mixteca.utm.mx](mailto:representanteinstitucional@mixteca.utm.mx)

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

| Prioridad | ID de acuerdo con el SIFAM | Nombre del proyecto                                                                                        | Tipo de proyecto          |                     |              |                        |               | Monto autorizado (A) | No. (s) de Contrato (B) | INICIO | TERMINO | Monto no Diferencia Autorizado C y D | Monto ejercido (D) | Remanente (E) -B-D | Equipos físicos/equipamiento (programado/autorizado) |                 |        | Acciones que sustentan el avance                                                                                                                                                                       | % de avance | Fechas Reales |        | Observaciones | Retraso a la TESOFE |         |                  |               | Actas   |                                          |                                                                                                    |                                                    |       |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|--------|---------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------|---------------|---------------------|---------|------------------|---------------|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
|           |                            |                                                                                                            | Otra nueva (construcción) | Obra de continuidad | Equipamiento | Adecuaciones y mejoras | Mantenimiento |                      |                         |        |         |                                      |                    |                    | Proyecto sustentable                                 | Cantidad        | Unidad |                                                                                                                                                                                                        |             | Medios        | Costos |               | Inicio              | Termino | Línea de Crédito | Fecha de pago | Importe | Entregas- Recepción (Acta firmado) MONTO | Fecha                                                                                              | Administración de Recepción (formato DCE/SU) MONTO | Fecha |  |  |  |  |  |  |
| 1         | 2                          | Equipo informático para Salas de Computo, Laboratorio de Matemática y Laboratorio de Modelación Matemática | X                         |                     |              |                        |               |                      |                         |        |         |                                      |                    | \$ 7714514.00      |                                                      |                 | 13     | Computadora especializada con memoria unificada de 16GB<br>Computadora de escritorio RGB<br>Computadora de escritorio RGB<br>Mesas para computadora<br>Sillas<br>Equipo de cómputo de alto rendimiento | 8           | 2             | 2      | 29.92         | 69.28               | 24.27   | 179.91           | 69.28         | 0.00%   | GLOBAL DEL PROYECTO                      | Se está en espera del oficio de autorización de recursos para iniciar con el proceso de licitación |                                                    |       |  |  |  |  |  |  |
| 2         | 3                          | Terminación del Centro de Modelación Matemática                                                            | X                         |                     |              |                        |               |                      |                         |        |         |                                      |                    | \$ 3,000,000.00    |                                                      |                 | 1      | Cabecera<br>Saneantes<br>Medición matemática<br>Dirección<br>Pasillos y escaleras<br>Sala de juntas                                                                                                    | 19          | 2             | 1      | 29.92         | 69.28               | 24.27   | 179.91           | 69.28         | 0.00%   | GLOBAL DEL PROYECTO                      | Se está en espera del oficio de autorización de recursos para iniciar con el proceso de licitación |                                                    |       |  |  |  |  |  |  |
| 3         | 5                          | Equipoamiento de la carrera de Ingeniería Civil                                                            | X                         |                     |              |                        |               |                      |                         |        |         |                                      |                    | \$ 2,307,589.00    |                                                      |                 | 5      | Máquina universal automática<br>Edificación total topográfica                                                                                                                                          | 1           | 5             | 5      | 29.92         | 69.28               | 24.27   | 179.91           | 69.28         | 0.00%   | GLOBAL DEL PROYECTO                      | Se está en espera del oficio de autorización de recursos para iniciar con el proceso de licitación |                                                    |       |  |  |  |  |  |  |
| 4         | 1                          | Equipoamiento del Laboratorio de Mecánica en el área Mecánica                                              | X                         |                     |              |                        |               |                      |                         |        |         |                                      |                    | \$ 3,869,869.00    |                                                      |                 | 1      | Sistema de enfriamiento en automatización y control industrial<br>Sistema modular de Enfriamiento en Neumática Básica<br>Sistema de Enfriamiento Básico en Hidráulica                                  | 1           | 1             | 1      | 29.92         | 69.28               | 24.27   | 179.91           | 69.28         | 0.00%   | GLOBAL DEL PROYECTO                      | Se está en espera del oficio de autorización de recursos para iniciar con el proceso de licitación |                                                    |       |  |  |  |  |  |  |
| 5         | 4                          | Equipoamiento de salones de clases con equipo audiovisual y de proyección                                  | X                         |                     |              |                        |               |                      |                         |        |         |                                      |                    | \$ 148,779.00      |                                                      |                 | 10     | Video proyector                                                                                                                                                                                        | 10          | 10            | 10     | 29.92         | 69.28               | 24.27   | 179.91           | 69.28         | 0.00%   | GLOBAL DEL PROYECTO                      | Se está en espera del oficio de autorización de recursos para iniciar con el proceso de licitación |                                                    |       |  |  |  |  |  |  |
|           |                            |                                                                                                            |                           |                     |              |                        |               |                      |                         |        |         |                                      | \$16,778,751.00    | \$0.00             | \$0.00                                               | \$16,778,751.00 |        |                                                                                                                                                                                                        |             |               |        |               |                     |         |                  |               |         |                                          |                                                                                                    |                                                    |       |  |  |  |  |  |  |

ARQ. ITZAMNATUL MOYA SOLANO  
OBRAS

MTRA. ALMA YADIRA SALAZAR GOVEA  
PLANEACIÓN

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS  
RECTORA

1 Se capturan los aspectos que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.  
2 En esta sección se indicará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas las fechas deben ser del tipo dd/mm/aa.

2023

EJERCICIO ESCOLAR EN EL QUE OTORGAR EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

**FAM**

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Trimestre y año que se reporta

ABRIL - JUNIO 2023

Fecha de elaboración: 06/07/2023



Porcentaje de avance

0.00%

PROYECTO

1

Nombre de la obra


Equipamiento Informático para Salas de Computo, Laboratorio de Multimedia y Centro de Modelación Matemática

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA OBRA O PROYECTO




LABORATORIO DE MULTIMEDIOS  
LATITUD: 17.282827°  
LONGITUD: -91.262419°  
CENTRO DE MODELACION  
MATEMATICA  
LATITUD: 17.272961°  
LONGITUD: -91.262419°  
SALAS DE COMPUTO  
LATITUD: 17.285019°  
LONGITUD: -91.262541°


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

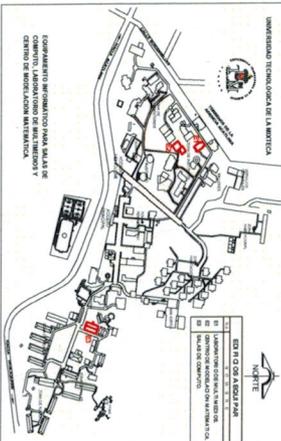


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

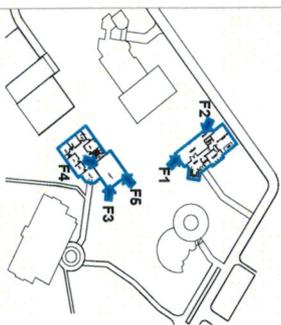

FOTOS

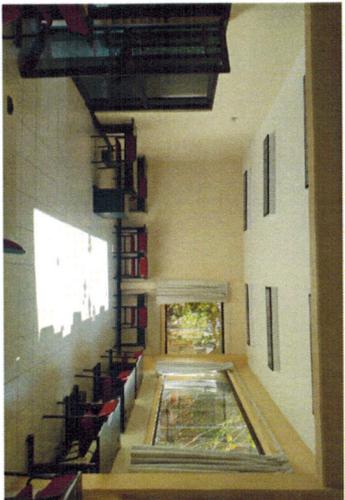


F1. LABORATORIO DE MULTIMEDIOS

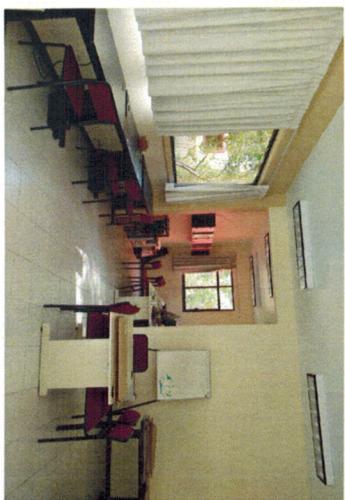


F2. LABORATORIO DE MULTIMEDIOS



F3. CENTRO DE MODELACION MATEMATICA

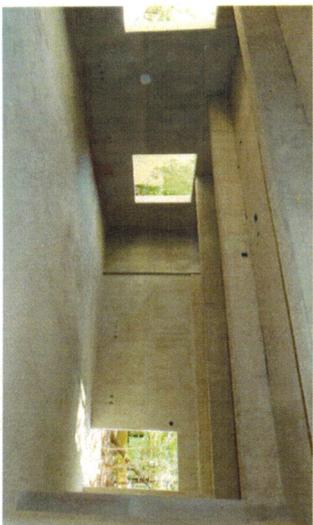

F4. CENTRO DE MODELACION MATEMATICA

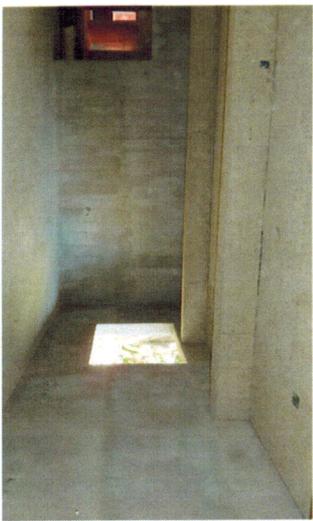

F5. CENTRO DE MODELACION MATEMATICA

Observaciones :

ARQ. ITZAMATIL MOYA SOLIANO  
OBRAS

MTRA. ALMA YADIERA SALAZAR GOVEA  
PLANIFICACION

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS  
RECTORA

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una peseta, se podrán copiar tantas pesetas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

ESFUERZO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Trimestre y año que se reporta

ABRIL-JUNIO\_2023

Fecha de elaboración: 06/07/2023



Porcentaje de avance

0.00%

PROYECTO

1

Nombre de la obra

GEREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA OBRA O PROYECTO



Equipoamiento informático para Salas de Computo, Laboratorio de Multimedia y Centro de Modelacion Matematica

CROQUIS REFERENCIAL EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




LABORATORIO DE MULTIMEDIOS  
LATITUD: 17.28333°  
LONGITUD: -97.80541°  
CENTRO DE MODELACION  
MATEMATICA  
LATITUD: 17.28291°  
LONGITUD: -97.80541°  
SALAS DE COMPUTO  
LATITUD: 17.28557°  
LONGITUD: -97.805281°

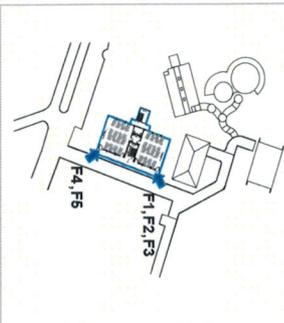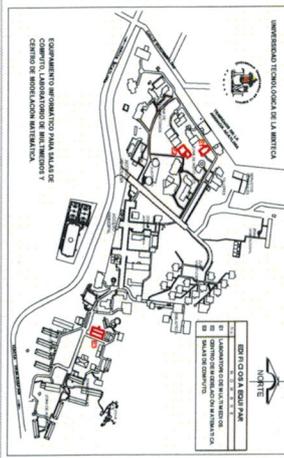

FOTOS

Observaciones :

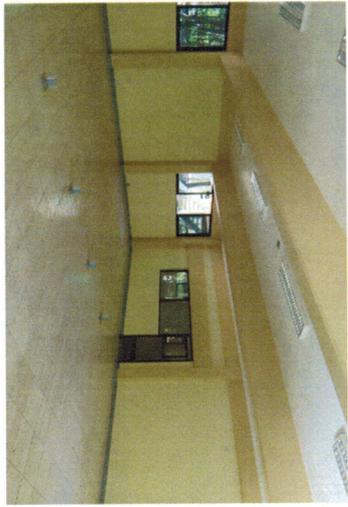

F1: SALA DE COMPUTO




F2: SALA DE COMPUTO



F3: SALA DE COMPUTO



F4: SALA DE COMPUTO

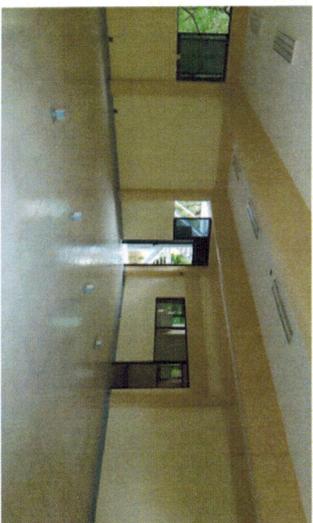

F5: SALA DE COMPUTO

ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO  
OBRAS

MTRA. ALMA YADIRA SALAZAR GOVEA  
PLANIFICACION

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS  
RECTORA

NOTA

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EDIFICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

**FAM**

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Trimestre y año que se reporta  
**ABRIL-JUNIO\_2023**

Fecha de elaboración: 08/07/2023



PROYECTO

2

Nombre de la obra


Terminación del Centro de Modelación Matemática

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

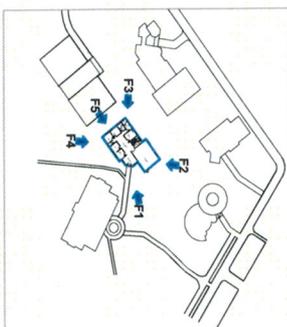

Porcentaje de avance  
**0.00%**


**FOTOS**



F1. VISTA 1 EDIFICIO



F2. VISTA 2 EDIFICIO

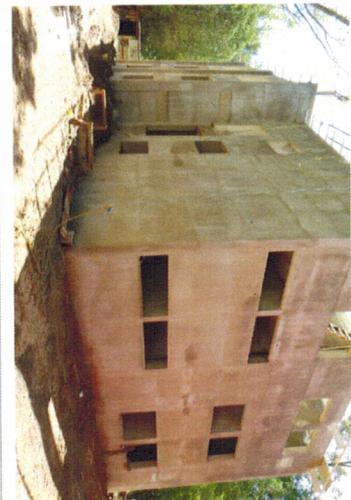

F3. VISTA 3 EDIFICIO



F4. VISTA 4 EDIFICIO



F5. VISTA 5 EDIFICIO

Observaciones:

ARO ITZAMATIL MOYA SOLANO  
OPRAS

MTRA. ALMA YADIRA SALAZAR GOVEA  
PLANIFICACION

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS  
RECTORA

**NOTA**

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una peseta, se podrán copiar tantas pesetas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO

3

Nombre de la obra

Equipamiento de la carrera de Ingeniería Civil


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



LABORATORIO DE INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ  
LITITIO 1, 2 81130\*  
LONGITUD: -97.80354\*

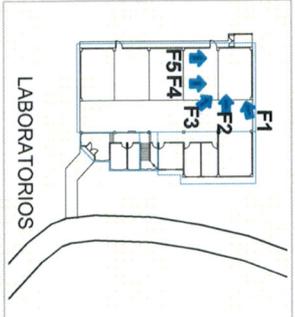


Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS

Observaciones :

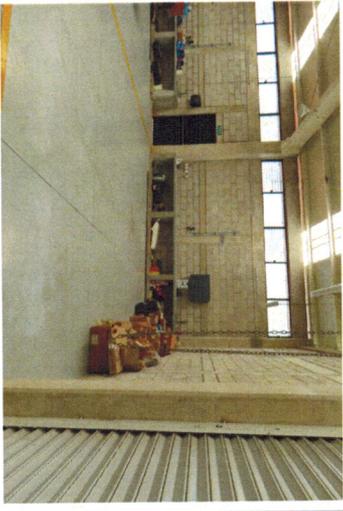


F1: VISTA 1 LABORATORIO



F2: VISTA 2 LABORATORIO



F3: VISTA 3 LABORATORIO

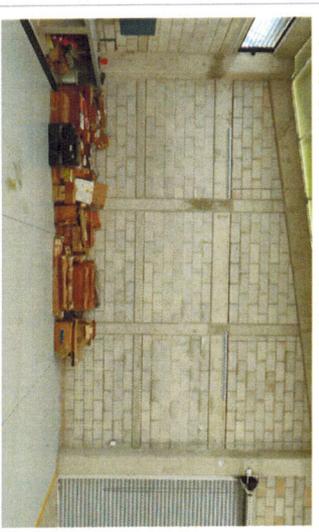

F4: VISTA 4 LABORATORIO



F5: VISTA 5 LABORATORIO

ARCITZAMATI UMOYA SOLANO  
OPÉRAS

MTRA. ALMA YADIRA SALAZAR GOVEA  
PLANIFICACIÓN

MTRA. MARÍA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS  
RECTORA

NOTA

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra



Porcentaje de avance

0.00%

Proyecto

4

Nombre de la obra


Equipamiento del Laboratorio de Mecatronica en el área Mecánica

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA OBRA O PROYECTO




INSTITUTO DE ELECTRONICA Y MECANICA  
LATITUD: 17.282818°  
LONGITUD: -97.362668°

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

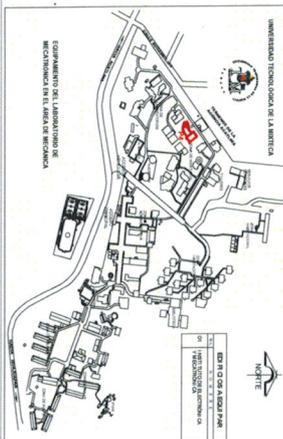

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

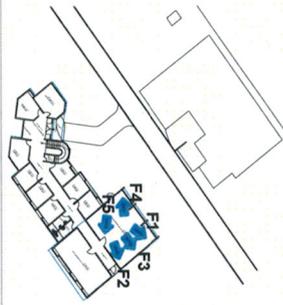


FOTOS



F1. VISTA 1 LABORATORIO



F2. VISTA 2 LABORATORIO

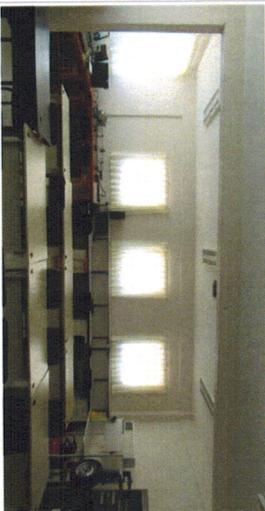

F3. VISTA 3 LABORATORIO



F4. VISTA 4 LABORATORIO



F5. VISTA 5 LABORATORIO

Observaciones :

ARO. ITZAMATJUL MOYA SOLANO  
OBRAS

MTRA. ALMA YADIRA SALAZAR GOVEA  
PLANEACION

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS  
RECTORA

NOTA

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastilla, se podrán copiar tantas pastillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2023

EFERENCIO FISCAL EN EL CUIE OTORGADO EL RECURSO



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCION DE PORTAQUEMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Trimestre y año que se reporta  
ABRIL - JUNIO 2023

Fecha de elaboración: 08/07/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Proyecto: 5

Nombre de la obra: Equipamiento de salones de clases con equipo audiovisual y de proyección

Georeferencia o croquis de localización de la obra o proyecto

Croquis referenciado en planta de conjunto de la obra o proyecto

Ubicación de la obra o proyecto con fotos referenciadas

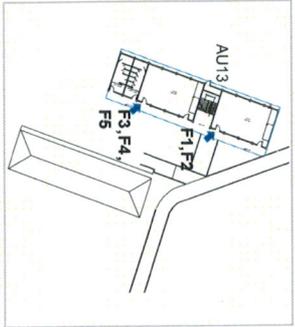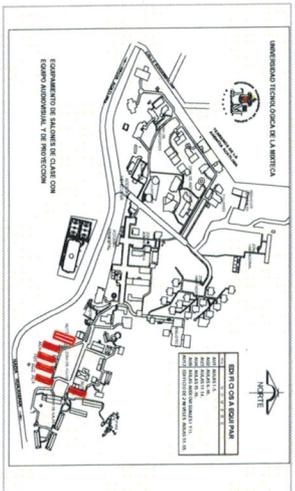

Porcentaje de avance  
**0.00%**

FOTOS


Observaciones:



F1. VISTA 1 AULAS



F2. VISTA 2 AULAS

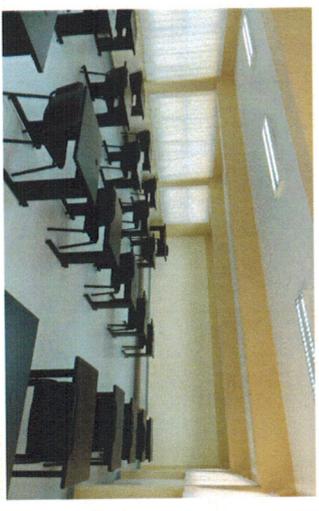

F3. VISTA 3 AULAS



F4. VISTA 4 AULAS



F5. VISTA 5 AULAS

ARQ. ITZAMATIL MOYA SOLANO  
GERAS

MTRA. ALMA YABIRA SALAZAR GOVEA  
PLANIFICACION

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS  
RECTORA

NOTA:  
Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

ESTADÍSTICO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RESCUBRO

FOMO DE APORTACIONES MULTIPLES

**FAM**

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Trimestre y año que se reporta  
ABRIL-JUNIO\_2023

Fecha de elaboración: 05/07/2023



Porcentaje de avance

0.00%




Correspondencia fotográfica a la obra

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA AMÉRICA  
LATITUD: 17.237348°  
LONGITUD: -97.804301°



COMPARATIVO DE PLANTAS DE CLASES CON COMPO MATERIAL, EN INTERVENCIÓN

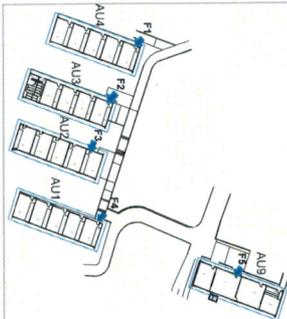


PROYECTO: 5 Nombre de la obra: **Equipamiento de salones de clases con equipo audiovisual y de proyección**


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

FOTOS

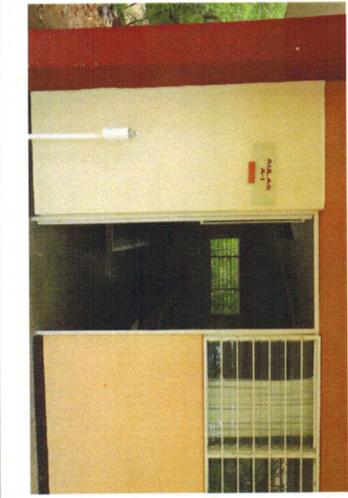

F1. VISTA 1 AULAS

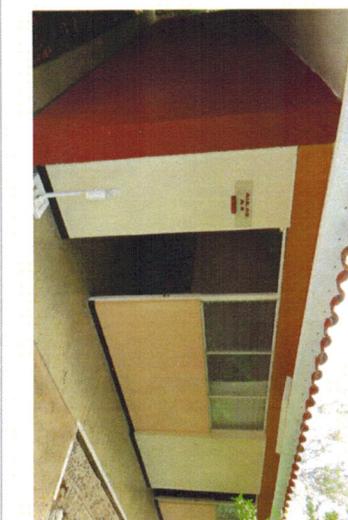


F2. VISTA 2 AULAS

Observaciones :



F3. VISTA 3 AULAS

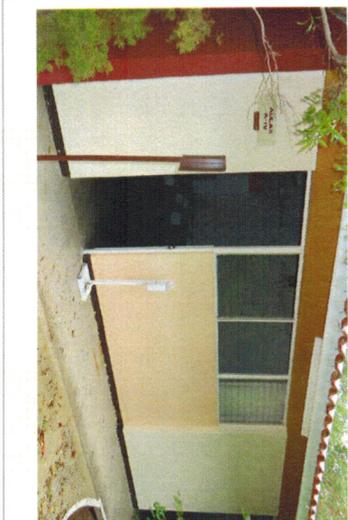

F4. VISTA 4 AULAS



F5. VISTA 5 AULAS

ARO. ITZAMATUL MOYA SOLANO  
OBRAS

MTRA. ALMA VAQUERA SALAZAR GOVEA  
PLANIFICACION

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS  
RECTORA

NOTA

• Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
